


# 高級中等以下學校校舍管理系統-簡易使用說明

內容	頁碼
◆校舍管理區說明	2
1-1綠建築填報	3
◆拆建管考區說明	4
2-1拆除進度填報	5
2-2拆建進度填報	6
2-2-1拆建進度填報_資料狀態	7
2-2-2拆建進度填報_需填報完成日期之項目	8
2-3每月工程進度填報	9
2-4縣府每月進度填報	10
◆補充說明-拆除重建填報細項	11
◆補充說明-拆除整地填報細項	24

※針對109-111年度校舍整建一般性補助款拆除重建案及拆除整地案說明

# ◆校舍管理區說明

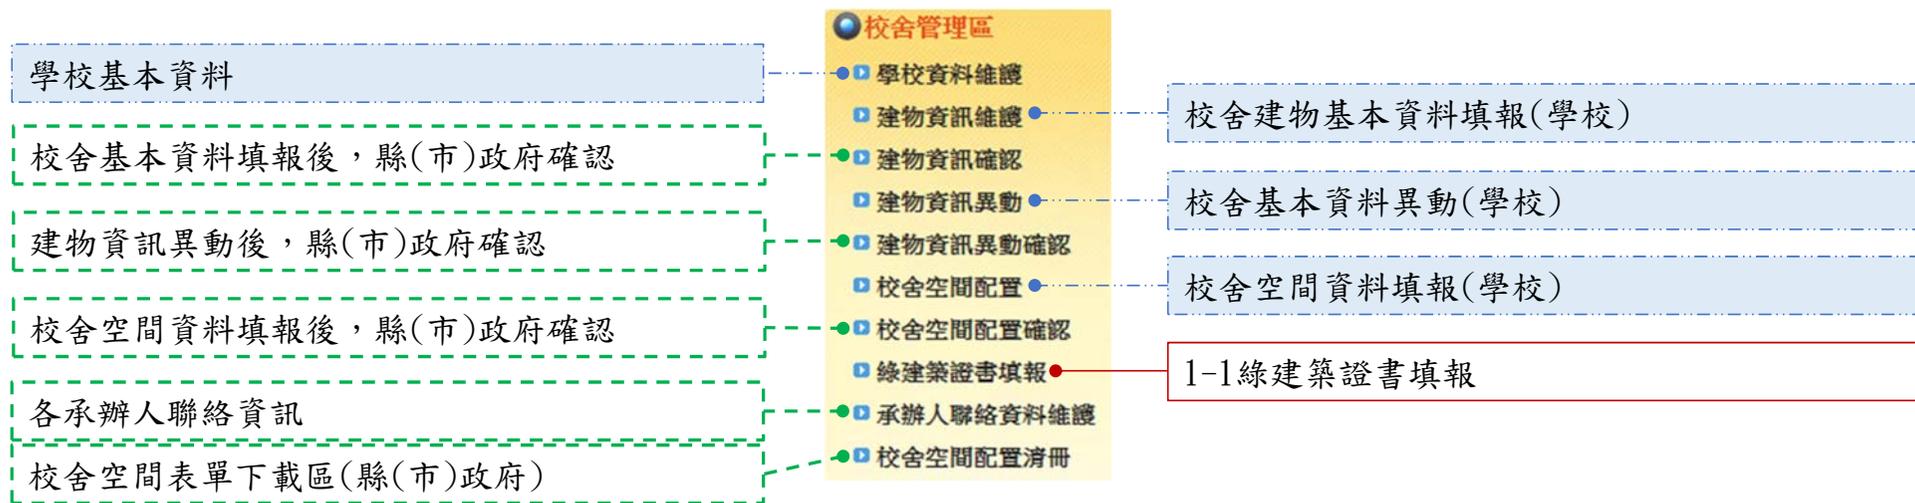

# 1-1綠建築填報(學校)

- 校舍管理區
- 學校資料維護
- 建物資訊維護
- 建物資訊確認
- 建物資訊異動
- 建物資訊異動確認
- 校舍空間配置
- 校舍空間配置確認
- 綠建築證書填報**
- 承辦人聯絡資料維護
- 校舍空間配置清冊

校舍管理區 > 綠建築證書填報 1785 秒後自動登出 重新計誌

縣市鄉鎮  請選擇 學校級別

學校名稱  學校代號

序號	學校代號	學校名稱	縣市	鄉鎮	學校級別	建物筆數	功能
1	054651	苗栗縣頭份市六合國民小學	苗栗縣	頭份市	國小	6	<a href="#">檢視</a>

校舍管理區 > 綠建築證書填報 1778 秒後自動登出 重新計誌

學校名稱  縣市鄉鎮/校級

序號	建物名稱	主要用途	使用狀態	填報狀態	功能
1	前棟	教學	已拆除		
2	後棟	教學	已拆除		
3	東棟	教學	已拆除		
4	活動中心	活動中心(體育館)	使用中	<a href="#">檢視</a>	
5	廚房	餐飲場所	使用中	<a href="#">檢視</a>	
6	安親班	教學	已拆除		

校舍管理區 > 綠建築證書填報 1772 秒後自動登出 重新計誌

學校名稱  縣市鄉鎮/校級

建物名稱  使用狀態

填報日期

領得綠建築證書日期

綠建築證書級別  合格  銅級  銀級  黃金級  鑽石級

綠建築證書圖檔 (jpg, pdf) 最大 2M  未選擇任何檔案

備註

➤路徑：【校舍管理區】>【綠建築證書填報】>[建物筆數] / [檢視]>[填報]

1. 校舍擁有綠建築證書者填報。

填報狀態：  
填寫後，顯示已填。

功能：  
填寫後，[檢視](#)/[修改](#)可再編輯。

填報狀態	功能
已填	<a href="#">檢視</a> <a href="#">修改</a>
	<a href="#">檢視</a>

依領得綠建築種類填報，並上傳檔案。

- 存檔：可重複修改內容
- 離開：取消編輯

# ◆ 拆建管考區說明

核定資料查詢

校舍報廢資料(完成日期、公文日期及文號)

學校填報後，由各縣(市)政府確認

核定案件經費支付類別、日期及金額

核定案件類別異動(改補強、拆除整地或註銷)

2-4填報各案件現況及落後情形

各式表單匯出

- 拆建管考區
- ▣ 拆建核定資料維護
- ▣ 地方政府進度維護
- 拆除進度填報
- 拆除進度填報確認
- 拆建進度填報
- 拆建進度填報確認
- ▣ 基本設計填報與檢核
- ▣ 細部設計填報與檢核
- ▣ 細部設計審查
- ▣ 細部設計審查結果核備
- 每月工程進度填報
- 每月工程進度審核
- ▣ 拆建經費執行狀況填報
- ▣ 拆建決標金額異動
- ▣ 拆建核定類別異動
- 拆建執行成效問卷填報
- 縣府每月進度填報
- ▣ 拆除進度回報彙整明細表
- ▣ 拆建核定經費執行清冊
- ▣ 拆建核定資料明細表
- ▣ 拆建執行成效問卷統計表
- ▣ 拆建核定資料統計表
- ▣ 每月執行進度回報明細表

2-1核定拆除重建案者，舊校舍拆除後填報

2-2核定拆除重建案或拆除整地案，各階段執行完成日期填報

屬106-108年度專案計畫補助拆除重建案填報

2-3工程開工後填報

核定案件決標金額異動

屬拆除重建案結案後由學校填寫問卷

## 2-1 拆除進度填報(學校)

➤路徑：【**拆建管考區**】>【**拆除進度填報**】>【**拆除設定**】>【**填報**】

1. 僅**拆除重建案**須填報校舍拆除進度。

- 拆建管考區
  - ▣ 拆建核定資料維護
  - ▣ 地方政府進度維護
  - ▣ 拆除進度填報
  - ▣ 拆除進度填報確認
  - ▣ 拆建進度填報
  - ▣ 拆建進度填報確認
  - ▣ 基本設計填報與檢核
  - ▣ 細部設計填報與檢核
  - ▣ 細部設計審查
  - ▣ 細部設計審查結果核備
  - ▣ 每月工程進度填報
  - ▣ 每月工程進度審核
  - ▣ 拆建經費執行狀況填報
  - ▣ 拆建決標金額異動
  - ▣ 拆建核定類別異動
  - ▣ 拆建執行成效問卷填報
  - ▣ 縣府每月進度填報
  - ▣ 拆除進度回報彙整明細表
  - ▣ 拆建核定經費執行清冊
  - ▣ 拆建核定資料明細表
  - ▣ 拆建執行成效問卷統計表
  - ▣ 拆建核定資料統計表
  - ▣ 每月執行進度回報明細表

拆建管考區 >> 拆除進度填報 1787 秒後自動登出 重新計誌

學校名稱 苗栗縣頭份市六合國民小學 縣市鄉鎮/校級 苗栗縣頭份市/國小

註：僅拆除重建，才需填報拆除進度

序號	學校名稱	縣市	拆除案名	經費來源	各案需求總經費	功能
1	苗栗縣頭份市六合國民小學	苗栗縣	前棟教室	一般性	101,640,000	拆除設定

離開

拆建管考區 >> 拆除進度填報 1792 秒後自動登出 重新計誌

學校名稱 苗栗縣頭份市六合國民小學 縣市鄉鎮/校級 苗栗縣頭份市/國小

拆除案名 前棟教室 申請類別 拆除重建

核定年度 106 年度 經費來源/各案需求總經費 一般性/101,640,000

序號	建物名稱	拆除完成日期	拆除填報日期	確認狀態	功能
1	前棟教室				填報

填報日期 2020/05/13

序號	照片說明	上傳照片
1		選擇檔案 未選擇任何檔案
2		選擇檔案 未選擇任何檔案
3		選擇檔案 未選擇任何檔案
4		選擇檔案 未選擇任何檔案

暫存 儲存後送審 離開

填報拆除完成日期，上傳照片並簡要說明。

- 暫存：可重複修改內容
- 儲存後送審：送出後，縣(市)政府至【**拆除進度填報確認**】審核
- 離開：取消編輯

## 2-2 拆建進度填報(學校)

### 拆建管考區

- 拆建核定資料維護
- 地方政府進度維護
- 拆除進度填報
- 拆除進度填報確認
- 拆建進度填報**
- 拆建進度填報確認
- 基本設計填報與檢核
- 細部設計填報與檢核
- 細部設計審查
- 細部設計審查結果核備
- 每月工程進度填報
- 每月工程進度審核
- 拆建經費執行狀況填報
- 拆建決標金額異動
- 拆建核定類別異動
- 拆建執行成效問卷填報
- 縣府每月進度填報
- 拆除進度回報彙整明細表
- 拆建核定經費執行清冊
- 拆建核定資料明細表
- 拆建執行成效問卷統計表
- 拆建核定資料統計表
- 每月執行進度回報明細表

拆建管考區 >> 拆建進度填報 1792 秒後自動登出 重新計數

序號	學校名稱	苗栗縣頭份市六合國民小學	縣市鄉鎮 / 校級	苗栗縣頭份市 / 國小	申請類別	經費來源	各案需求總經費	填報筆數	功能
1	前棟教室				拆除重建	一般性	101,640,000	5	進報
2	後棟				拆除整地	一般性	4,776,000	0	進報
3	東棟				拆除整地	一般性	1,813,000	0	進報

離開

---

拆建管考區 >> 拆建進度填報 1786 秒後自動登出 重新計數

學校名稱	苗栗縣頭份市六合國民小學	縣市鄉鎮 / 校級	苗栗縣頭份市 / 國小
拆除案名	前棟教室	申請類別	拆除重建
核定年度	106 年度	經費來源 / 各案需求總經費	一般性 / 101,640,000

離開

---

拆建管考區 >> 拆建進度填報 1786 秒後自動登出 重新計數

學校名稱	苗栗縣頭份市六合國民小學	縣市鄉鎮 / 校級	苗栗縣頭份市 / 國小
拆除案名	前棟教室	申請類別	拆除重建
核定年度	106 年度	經費來源 / 各案需求總經費	一般性 / 101,640,000

新增進度填報

學校名稱	苗栗縣頭份市六合國民小學	縣市鄉鎮 / 校級	苗栗縣頭份市 / 國小
拆除案名	前棟教室	申請類別	拆除重建
核定年度	106 年度	經費來源 / 各案需求總經費	一般性 / 101,640,000
完成日期		填報日期	2020/05/18
填報項目	請選擇...		
執行進度落後原因或問題			
因應對策			

暫存   儲存後送審   離開

➤ 路徑：【拆建管考區】>【拆建進度填報】>[填報] / [填報筆數]>[新增進度填報]

1. 拆除重建案及拆除整地案皆須填報進度。

填報筆數：顯示已填報該案進度的總筆數。

- 填報項目將依列管里程碑設置下拉式選單。
- 進度落後者，請填寫執行進度落後原因或問題及因應對策兩個欄位

- 暫存：可重複修改內容
- 儲存後送審：送出後，縣(市)政府至【拆建進度填報確認】審核
- 離開：取消編輯

# 2-2-1 拆建進度填報(學校)-資料狀態

(學校畫面)依確認情形及填寫狀態顯示

拆建管考區 >> 拆建進度填報 1786 秒後自動登出 重新計誌

學校名稱	南投縣名間鄉田豐國民小學	縣市鄉鎮/校級	南投縣名間鄉/國小
拆除案名	行政大樓A棟,教學大樓B棟	申請類別	拆除重建
核定年度	106 年度	經費來源/各案需求總經費	一般性/52,350,000

序號	填表日期	項目	完成日期	確認狀態	功能
1	2020/05/27	3.建築師選僱完成後之簽約日期	2020/03/23	填報中	檢視 確認 刪除
2	2020/05/27	2.設計監造勞務採購上網公告日期	2020/03/16	待確認	檢視
3	2020/05/27	2.設計監造勞務採購上網公告日期	2020/03/09	已確認	檢視
4	2020/05/27	2.設計監造勞務採購上網公告日期	2020/03/01	退回	檢視 確認

[離開](#)

學校填寫中，尚未送審，可檢視/修改/刪除

學校已送審，僅能檢視，等待縣(市)政府審核

學校已送審，僅能檢視，縣(市)政府已確認

學校送審後，縣(市)政府退回，可修改但無法刪除

(縣府畫面)顯示學校已送審，待確認之案件

拆建管考區 >> 拆建進度填報確認 1770 秒後自動登出 重新計誌

縣市鄉鎮:  請選擇

學校級別:

學校名稱:

確認狀態:

[查詢](#)

序號	學校名稱	拆除案名	項目	完成日期	確認狀態	功能
1	南投縣名間鄉田豐國民小學	行政大樓A棟,教學大樓B棟	2.設計監造勞務採購上網公告日期	2020/03/16	待確認	確認

可篩選確認狀態：填報中/待確認/退回/已確認

## 2-2-2 拆建進度填報(學校)\_需填報完成日期之項目

若流標時  
可重複填報

拆除重建	
<input checked="" type="checkbox"/>	設計監造勞務採購上網公告日期
<input type="checkbox"/>	建築師遴選完成後簽約日期
<input type="checkbox"/>	基本設計預定日期與審查情形
<input type="checkbox"/>	細部設計預定日期與審查情形
<input type="checkbox"/>	申請建照日期
<input type="checkbox"/>	領得建照日期
<input checked="" type="checkbox"/>	完成工程採購招標文件，上網公告日期
<input type="checkbox"/>	工程決標日期
<input type="checkbox"/>	工程開工日期
<input type="checkbox"/>	主體工程施作達1/3以上
<input type="checkbox"/>	主體結構完成
<input type="checkbox"/>	工程竣工日期
<input type="checkbox"/>	驗收完成日期
<input type="checkbox"/>	申請使用執照日期
<input type="checkbox"/>	領得使用執照日期

拆除整地	
<input type="checkbox"/>	申請建(拆)照日期
<input type="checkbox"/>	領得建(拆)照日期
<input type="checkbox"/>	完成工程採購招標文件，上網公告日期
<input type="checkbox"/>	工程決標日期
<input type="checkbox"/>	工程開工日期
<input type="checkbox"/>	舊建築物拆除完成日期
<input type="checkbox"/>	工程竣工日期
<input type="checkbox"/>	驗收完成日期

### 注意事項：

1. 填報進度完成日期，不可小於前一筆進度完成日期。
2. 當前填報進度若未送審，將無法繼續填寫下一個進度。
3. 當進度送審後被退回時，僅能修改內容，無法刪除該筆進度。

# 2-3每月工程進度填報(學校)

➤路徑：【**拆建管考區**】>【**每月工程進度填報**】>[填寫]>[新增每月工程進度]

1. **拆除重建案**須填報進度。

2. 學校於【**拆建進度填報**】填報工程開工日期，並由縣市政府審核通過後，方可進行填報。

最後狀態：

未開工：上未開工者，無法填報

待審：填寫後儲存後送審，等待縣(市)政府審核

通過：填寫後儲存後送審，縣(市)政府已審核通過

退回：填寫後儲存後送審，線(市)政府退回學校修改

依實際施工情形填報工程進度百分比。

● 暫存：可重複修改內容

● 儲存後送審：送出後，縣(市)政府至【**每月工程進度審核**】審核

● 離開：取消編輯

拆建管考區 >> 每月工程進度填報

1790 秒後自動登出 重新計誌

序號	拆建案名	各家需求總經費	申官次數	最後狀態	功能
1	前棟教室	101,640,000	0	未開工	填寫
2	後棟	4,776,000	0	未開工	
3	東棟	1,813,000	0	未開工	

離開

拆建管考區 >> 每月工程進度填報

1783 秒後自動登出 重新計誌

查無符合條件之資料!

新增每月工程進度

離開

拆建管考區 >> 每月工程進度填報

1766 秒後自動登出 重新計誌

學校名稱	苗栗縣頭份市六合國民小學	縣市鄉鎮/校級	苗栗縣頭份市/國小
拆建案名	前棟教室		
核定總面積/各家需求總經費	4,620.00㎡/101,640,000		
填報日期	2020/05/19		
年度月份	2020/04		
預定進度百分比	%		
實際進度百分比	%		
超前或落後百分比	%		
執行進度落後原因或問題			
因應對策			

暫存 儲存後送審 離開

# 2-4縣府每月進度填報(縣(市)政府)

## 拆建管考區

- 拆建核定資料維護
- 地方政府進度維護
- 拆除進度填報
- 拆除進度填報確認
- 拆建進度填報
- 拆建進度填報確認
- 基本設計填報與檢核
- 細部設計填報與檢核
- 細部設計審查
- 細部設計審查結果核備
- 每月工程進度填報
- 每月工程進度審核
- 拆建經費執行狀況填報
- 拆建決標金額異動
- 拆建核定類別異動
- 拆建執行成效問卷填報
- 縣府每月進度填報**
- 拆除進度回報彙整明細表
- 拆建核定經費執行清冊
- 拆建核定資料明細表
- 拆建執行成效問卷統計表
- 拆建核定資料統計表
- 每月執行進度回報明細表

拆建管考區 >> 縣府每月進度填報

1796 秒後自動登出 重新計數

縣市鄉鎮: 苗栗縣 請選擇 學校級別: 請選擇 經費來源: 不拘 學校名稱: 查詢

序號	學校名稱	拆除案名	申請類別	經費來源	各案需求總經費	填寫次數	坊址
1	苗栗縣苗栗市建功國民小學	一棟西棟教室	拆除重建	共同	94,050,000	0	填寫
2	苗栗縣苗栗市文山國民小學	北棟校舍	拆除重建	一般性	153,925,000	0	填寫
3	苗栗縣頭屋鄉頭屋國民小學	A棟, B棟	拆除重建	一般性	64,581,000	0	填寫
4	苗栗縣公館鄉公館國民小學	南二棟樓, 三至六年級	拆除重建	專案計畫	118,800,000	0	填寫
5	苗栗縣三義鄉育英國民小學	東面教室	拆除重建	一般性	47,520,000	0	填寫
6	苗栗縣西湖鄉西湖國民小學	北棟校舍	拆除重建	共同	50,490,000	0	填寫
7	苗栗縣西湖鄉西湖國民小學	東棟大樓	拆除重建	一般性	35,286,250	0	填寫
8	苗栗縣頭份市頭份國民小學	前棟	拆除重建	一般性	48,672,000	0	填寫
9	苗栗縣頭份市頭份國民小學	後棟	拆除重建	共同	71,280,000	0	填寫
10	苗栗縣頭份市六合國民小學	後棟	拆除整地	一般性	4,776,000	0	填寫
11	苗栗縣頭份市六合國民小學	東棟	拆除整地	一般性	1,813,000	0	填寫
12	苗栗縣頭份市六合國民小學	前棟教室	拆除重建	一般性	101,640,000	0	填寫

1 2 3

拆建管考區 >> 縣府每月進度填報

1790 秒後自動登出 重新計數

學校名稱: 苗栗縣頭份市六合國民小學 縣市鄉鎮/校級: 苗栗縣頭份市/國小  
 拆除案名: 前棟教室 核定總面積/各案需求總經費: 4,620.00㎡/101,640,000

查詢符合條件之資料!

新增每月進度填報

離開

拆建管考區 >> 縣府每月進度填報

1795 秒後自動登出 重新計數

學校名稱: 苗栗縣頭份市六合國民小學 縣市鄉鎮/校級: 苗栗縣頭份市/國小  
 拆除案名: 前棟教室 核定總面積/各案需求總經費: 4,620.00㎡/101,640,000

填報日期: 2020/05/19  
 年度月份: 2020/05

原因及現況

對策或後續進度說明

儲存 離開

➤路徑：【拆建管考區】>【縣府每月進度填報】>[填寫]>[新增每月進度填報]

1. 當**拆除重建案**或**拆除整地案**進度落後時，由縣(市)政府填報

依案件實際狀況填寫落後原因及後續對策。

- 儲存：可再重複修改內容
- 離開：取消編輯

# 補充說明-拆除重建填報細項

# 3-1-1 拆除進度填報(學校)-拆除重建\_設計監造勞務採購上網公告日期

## 拆除重建

- 設計監造勞務採購上網公告日期
- 建築師遴選完成後簽約日期
- 基本設計預定日期與審查情形
- 細部設計預定日期與審查情形
- 申請建照日期
- 領得建照日期
- 完成工程採購招標文件，上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 主體工程施作達1/3以上
- 主體結構完成
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期
- 申請使用執照日期
- 領得使用執照日期

完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2020/05/26
填報項目	2.設計監造勞務採購上網公告日期		
招標次數	<input checked="" type="checkbox"/> 第一次 <input type="checkbox"/> 第二次 <input type="checkbox"/> 第三次(含以上)		
招標單位	請選擇...		
執行進度落後原因或問題	<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>		
因應對策	<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>		
<input type="button" value="暫存"/> <input type="button" value="儲存後送審"/> <input type="button" value="離開"/>			

完成日期西元年月日

系統自動選取招標次數

招標單位：

學校/教育局(處)/工務局(處)/新工局(處)/其他

若執行進度落後，請填寫原因及對策

- 暫存：可重複修正，且暫無法填報他項進度，需送審後，方能進行下一階段進度填報作業
- 儲存後送審：送出後，由縣(市)政府審核
- 離開：取消編輯

# 3-1-2 拆除進度填報(學校)-拆除重建\_建築師遴選完成後之簽約日期

## 拆除重建

- 設計監造勞務採購上網公告日期
- **建築師遴選完成後簽約日期**
- 基本設計預定日期與審查情形
- 細部設計預定日期與審查情形
- 申請建照日期
- 領得建照日期
- 完成工程採購招標文件，上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 主體工程施作達1/3以上
- 主體結構完成
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期
- 申請使用執照日期
- 領得使用執照日期

完成日期	<input type="text" value="2020/05/26"/>	填報日期	2020/05/26
填報項目	3.建築師遴選完成後之簽約日期		
得標單位	統編	<input type="text"/>	
	公司名稱	<input type="text"/>	
	地址	<input type="text" value="請選擇"/>	<input type="text" value="請選擇"/>
	聯絡人	<input type="text"/>	聯絡電話 <input type="text"/>
	手機	<input type="text"/>	聯絡E-Mail <input type="text"/>
決標金額	<input type="text"/>	元	
決標金額是否含水保計畫	<input type="checkbox"/> 不含水保計畫 <input type="checkbox"/> 含水保計畫		
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		
<input type="button" value="儲存"/> <input type="button" value="儲存後送審"/> <input type="button" value="離開"/>			

完成日期西元年月日

得標建築師資料

遴選建築師之決標金額

當勾選**不含**水保計畫時，請填寫水保計畫金額

若執行進度落後，請填寫原因及對策

儲存後送審，再由縣(市)政府審核

# 3-1-3 拆除重建進度填報(學校)-拆除重建\_基本設計/細部設計預定日期與審查情形

## 拆除重建

- 設計監造勞務採購上網公告日期
- 建築師遴選完成後簽約日期
- 基本設計預定日期與審查情形
- 細部設計預定日期與審查情形
- 申請建照日期
- 領得建照日期
- 完成工程採購招標文件，上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 主體工程施作達1/3以上
- 主體結構完成
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期
- 申請使用執照日期
- 領得使用執照日期

## 基本設計

完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2020/05/26
填報項目	5.基本設計預定日期與審查情形		
審查結果	<input checked="" type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 修正後通過 <input type="checkbox"/> 不通過(修正後再審) 預定再審日期: <input type="text"/>		
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		
<input type="button" value="暫存"/>		<input type="button" value="儲存後送審"/>	<input type="button" value="離開"/>

基設完成日期西元年月日

依設計審議審查結果填寫

若執行進度落後，請填寫原因及對策

儲存後送審，再由縣(市)政府審核

## 細部設計

完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2020/05/26
填報項目	7.細部設計預定日期與審查情形		
審查結果	<input checked="" type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 修正後通過 <input type="checkbox"/> 不通過(修正後再審) 預定再審日期: <input type="text"/>		
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		
<input type="button" value="暫存"/>		<input type="button" value="儲存後送審"/>	<input type="button" value="離開"/>

細設完成日期西元年月日

依設計審議審查結果填寫

若執行進度落後，請填寫原因及對策

儲存後送審，再由縣(市)政府審核。

# 3-1-4 拆除進度填報(學校)-拆除重建\_申請/領得建照日期

## 拆除重建

- 設計監造勞務採購上網公告日期
- 建築師遴選完成後簽約日期
- 基本設計預定日期與審查情形
- 細部設計預定日期與審查情形
- 申請建照日期
- 領得建照日期
- 完成工程採購招標文件·上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 主體工程施作達1/3以上
- 主體結構完成
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期
- 申請使用執照日期
- 領得使用執照日期

### 申請建照日期

完成日期 [日期選擇器]

填報日期 2020/05/26

填報項目 9.申請建照日期

執行進度落後原因或問題

因應對策

暫存 儲存後送審 離開

完成日期西元年月日

若執行進度落後，請填寫原因及對策

### 領得建照日期

完成日期 [日期選擇器]

填報日期 2020/05/26

填報項目 10.領得建照日期

建照 選擇檔案 未選擇任何檔案 (pdf檔)

執行進度落後原因或問題

因應對策

暫存 儲存後送審 離開

完成日期西元年月日

若執行進度落後，請填寫原因及對策

# 3-1-5 拆除重建進度填報(學校)-拆除重建\_完成工程採購招標文件，上網公告日期

## 拆除重建

- 設計監造勞務採購上網公告日期
- 建築師遴選完成後簽約日期
- 基本設計預定日期與審查情形
- 細部設計預定日期與審查情形
- 申請建照日期
- 領得建照日期
- 完成工程採購招標文件，上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 主體工程施作達1/3以上
- 主體結構完成
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期
- 申請使用執照日期
- 領得使用執照日期

完成日期:  2020/05/26

填報項目: 3.完成工程採購招標文件，上網公告日期

招標單位: 請選擇...

發包圖說: 選擇檔案 未選擇任何檔案 (pdf檔)

預算表: 選擇檔案 未選擇任何檔案 (pdf檔)

上傳發包圖說及預算表

執行進度落後原因或問題

因應對策

暫存 儲存後送審 離開

完成日期西元年月日

招標單位：

學校/教育局(處)/工務局(處)/  
新工局(處)/其他

若執行進度落後，請填寫  
原因及對策

# 3-1-6 拆除進度填報(學校)-拆除重建\_工程決標日期

## 拆除重建

- 設計監造勞務採購上網公告日期
- 建築師遴選完成後簽約日期
- 基本設計預定日期與審查情形
- 細部設計預定日期與審查情形
- 申請建照日期
- 領得建照日期
- 完成工程採購招標文件·上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 主體工程施作達1/3以上
- 主體結構完成
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期
- 申請使用執照日期
- 領得使用執照日期

完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2020/05/26
填報項目	4.工程決標日期		
工程標案名稱	<input type="text"/>		
發包金額	<input type="text"/>	元	填寫發包金額及決標金額
決標金額	<input type="text"/>	元	
決標金額是否含水保工程	<input checked="" type="checkbox"/> 不含水保工程 <input type="checkbox"/> 含水保工程		
水保工程金額	<input type="text"/>	元	
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		
<input type="button" value="暫存"/> <input type="button" value="儲存後送審"/> <input type="button" value="離開"/>			

完成日期西元年月日

工程標案名稱

填寫發包金額及決標金額

若勾選不含水保工程時，請填寫水保工程金額

若執行進度落後，請填寫原因及對策

# 3-1-7 拆除進度填報(學校)-拆除重建\_工程開工日期

## 拆除重建

- 設計監造勞務採購上網公告日期
- 建築師遴選完成後簽約日期
- 基本設計預定日期與審查情形
- 細部設計預定日期與審查情形
- 申請建照日期
- 領得建照日期
- 完成工程採購招標文件，上網公告日期
- 工程決標日期
- **工程開工日期**
- 主體工程施作達1/3以上
- 主體結構完成
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期
- 申請使用執照日期
- 領得使用執照日期

完成日期	<input type="text" value="2020/05/26"/>	填報日期	2020/05/26
填報項目	5. 工程開工日期		
工程預定進度表	選擇檔案   未選擇任何檔案 (pdf檔)		
執行進度落後原因或問題	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>		
因應對策	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>		

完成日期西元年月日

上傳工程預定進度表

若執行進度落後，請填寫原因及對策

# 3-1-8 拆除進度填報(學校)-拆除重建\_主體工程施作達1/3以上

## 拆除重建

- 設計監造勞務採購上網公告日期
- 建築師遴選完成後簽約日期
- 基本設計預定日期與審查情形
- 細部設計預定日期與審查情形
- 申請建照日期
- 領得建照日期
- 完成工程採購招標文件，上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- **主體工程施作達1/3以上**
- 主體結構完成
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期
- 申請使用執照日期
- 領得使用執照日期

完成日期	<input type="text" value="2020/05/26"/>	填報日期	2020/05/26	
填報項目	7.主體工程施作達 1/3 以上			
基礎鋼筋配管全貌 照片(4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M	序號	照片說明	上傳照片	
	1		選擇檔案 未選擇任何檔案	
	2		選擇檔案 未選擇任何檔案	
	3		選擇檔案 未選擇任何檔案	
	4		選擇檔案 未選擇任何檔案	
	柱樑鋼筋配管全貌 照片(4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M	1		選擇檔案 未選擇任何檔案
		2		選擇檔案 未選擇任何檔案
		3		選擇檔案 未選擇任何檔案
		4		選擇檔案 未選擇任何檔案
	樓板鋼筋配管全貌 照片(4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M	1		選擇檔案 未選擇任何檔案
		2		選擇檔案 未選擇任何檔案
		3		選擇檔案 未選擇任何檔案
		4		選擇檔案 未選擇任何檔案
	四向建物 外觀立面照片(4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M	1		選擇檔案 未選擇任何檔案
		2		選擇檔案 未選擇任何檔案
		3		選擇檔案 未選擇任何檔案
4			選擇檔案 未選擇任何檔案	
執行進度落後原因或問題				
因應對策				
<input type="button" value="暫存"/> <input type="button" value="儲存後送審"/> <input type="button" value="離開"/>				

完成日期西元年月日

上傳新建校舍施工照片，共16張，並簡要說明。

若執行進度落後，請填寫原因及對策

# 3-1-9 拆除進度填報(學校)-拆除重建\_主體結構完成

## 拆除重建

- 設計監造勞務採購上網公告日期
- 建築師遴選完成後簽約日期
- 基本設計預定日期與審查情形
- 細部設計預定日期與審查情形
- 申請建照日期
- 領得建照日期
- 完成工程採購招標文件，上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 主體工程施作達1/3以上
- **主體結構完成**
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期
- 申請使用執照日期
- 領得使用執照日期

完成日期	填報日期	
<input type="text"/>	2020/05/26	
8.主體結構完成		
序號	照片說明	上傳照片
校舍室內照片 (4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M		
1		選擇檔案 未選擇任何檔案
2		選擇檔案 未選擇任何檔案
3		選擇檔案 未選擇任何檔案
4		選擇檔案 未選擇任何檔案
廁所照片 (4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M		
1		選擇檔案 未選擇任何檔案
2		選擇檔案 未選擇任何檔案
3		選擇檔案 未選擇任何檔案
4		選擇檔案 未選擇任何檔案
樓梯走廊照片 (4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M		
1		選擇檔案 未選擇任何檔案
2		選擇檔案 未選擇任何檔案
3		選擇檔案 未選擇任何檔案
4		選擇檔案 未選擇任何檔案
四向建物外觀立面照片(4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M		
1		選擇檔案 未選擇任何檔案
2		選擇檔案 未選擇任何檔案
3		選擇檔案 未選擇任何檔案
4		選擇檔案 未選擇任何檔案
執行進度落後原因或問題		
因應對策		
儲存 儲存後送審 離開		

完成日期西元年月日

上傳新建校舍施工照片，共16張，並簡要說明。

若執行進度落後，請填寫原因及對策

# 3-1-10 拆除進度填報(學校)-拆除重建\_工程竣工日期

## 拆除重建

- 設計監造勞務採購上網公告日期
- 建築師遴選完成後簽約日期
- 基本設計預定日期與審查情形
- 細部設計預定日期與審查情形
- 申請建照日期
- 領得建照日期
- 完成工程採購招標文件，上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 主體工程施作達1/3以上
- 主體結構完成
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期
- 申請使用執照日期
- 領得使用執照日期

完成日期	<input type="text" value=""/>	填報日期	2020/05/26	
填報項目	9.工程竣工日期			
竣工圖說	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案	<input type="button" value="上傳發包圖說及預算表"/>	(pdf檔)	
結算表	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案		(pdf檔)	
結算金額	<input type="text" value=""/> 元			
校舍室內照片 (4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M	序號	照片說明	上傳照片	
	1		<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案	
	2		<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案	
	3		<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案	
	4		<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案	
	廁所照片 (4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M	1		<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
		2		<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
		3		<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
		4		<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
	樓梯走廊照片 (4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M	1		<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
		2		<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
		3		<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
		4		<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
	四向建物 外觀立面照片(4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M	1		<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
		2		<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
		3		<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案
4			<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案	
執行進度落後原因或問題	<input type="text" value=""/>			
因應對策	<input type="text" value=""/>			

完成日期西元年月日

上傳發包圖說及預算表

上傳發包圖說及預算表

上傳新建校舍施工照片，共16張，並簡要說明。

若執行進度落後，請填寫原因及對策

# 3-1-11 拆除進度填報(學校)-拆除重建\_驗收完成日期

## 拆除重建

- 設計監造勞務採購上網公告日期
- 建築師遴選完成後簽約日期
- 基本設計預定日期與審查情形
- 細部設計預定日期與審查情形
- 申請建照日期
- 領得建照日期
- 完成工程採購招標文件，上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 主體工程施作達1/3以上
- 主體結構完成
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期
- 申請使用執照日期
- 領得使用執照日期

完成日期	<input type="text" value=""/>	填報日期	2020/05/26
填報項目	10. 驗收完成日期		
執行進度落後原因或問題	<div style="border: 1px solid red; height: 100px;"></div>		
因應對策			
<input type="button" value="暫存"/> <input type="button" value="儲存後送審"/> <input type="button" value="離開"/>			

完成日期西元年月日

若執行進度落後，請填寫原因及對策

# 3-1-12 拆除進度填報(學校)-拆除重建\_申請/領得使用執照日期

## 拆除重建

- 設計監造勞務採購上網公告日期
- 建築師遴選完成後簽約日期
- 基本設計預定日期與審查情形
- 細部設計預定日期與審查情形
- 申請建照日期
- 領得建照日期
- 完成工程採購招標文件·上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 主體工程施作達1/3以上
- 主體結構完成
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期
- 申請使用執照日期
- 領得使用執照日期

### 申請使用執照日期

完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2020/05/26
填報項目	1.1.申請使用執照日期		
執行進度落後原因或問題	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>		
因應對策	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>		
<input type="button" value="暫存"/> <input type="button" value="儲存後送審"/> <input type="button" value="離開"/>			

完成日期西元年月日

若執行進度落後，請填寫原因及對策

### 領得使用執照日期

完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2020/05/26
填報項目	1.2.領得使用執照日期		
使用執照	<input type="button" value="選擇檔案"/> <input type="button" value="未選擇任何檔案"/> (pdf檔)		
執行進度落後原因或問題	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>		
因應對策	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>		
<input type="button" value="暫存"/> <input type="button" value="儲存後送審"/> <input type="button" value="離開"/>			

完成日期西元年月日

上傳使用執照檔案

若執行進度落後，請填寫原因及對策

# 補充說明-拆除整地填報細項

### 3-2-1 拆建進度填報(學校)-拆除整地\_申請/領得建(拆)照日期

#### 拆除整地

- 申請建(拆)照日期
- 領得建(拆)照日期
- 完成工程採購招標文件，上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 舊建築物拆除完成日期
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期

#### 申請建(拆)照日期

完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2020/05/26
填報項目	1.申請建(拆)照日期		
執行進度落後原因或問題	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>		
因應對策	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>		
<input type="button" value="暫存"/> <input type="button" value="儲存後送審"/> <input type="button" value="離開"/>			

完成日期西元年月日

若執行進度落後，請填寫原因及對策

#### 領得建(拆)照日期

完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2020/05/26
填報項目	2.領得建(拆)照日期		
執行進度落後原因或問題	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>		
因應對策	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>		
<input type="button" value="暫存"/> <input type="button" value="儲存後送審"/> <input type="button" value="離開"/>			

完成日期西元年月日

若執行進度落後，請填寫原因及對策

### 3-2-2 拆除進度填報(學校)-拆除整地\_完成工程採購招標文件，上網公告日期

#### 拆除整地

- 申請建(拆)照日期
- 領得建(拆)照日期
- 完成工程採購招標文件，上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 舊建築物拆除完成日期
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期

完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2020/05/26
填報項目	3.完成工程採購招標文件，上網公告日期		
招標單位	請選擇...		
發包圖說	選擇檔案 未選擇任何檔案		(pdf檔)
預算表	選擇檔案 未選擇任何檔案		(pdf檔)
執行進度落後原因或問題	<div style="border: 2px solid red; height: 100px;"></div>		
因應對策	<div style="border: 2px solid red; height: 100px;"></div>		
<input type="button" value="暫存"/> <input type="button" value="儲存後送審"/> <input type="button" value="離開"/>			

完成日期西元年月日

選擇招標單位：  
學校/教育局(處)/工務局(處)/  
新工局(處)/其他

若執行進度落後，請填寫  
原因及對策

### 3-2-3 拆除進度填報(學校)-拆除整地\_工程決標日期

#### 拆除整地

- 申請建(拆)照日期
- 領得建(拆)照日期
- 完成工程採購招標文件，上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 舊建築物拆除完成日期
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期

完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2020/05/26
填報項目	4.工程決標日期		
工程標案名稱	<input type="text"/>		
發包金額	<input type="text"/> 元	決標金額	<input type="text"/> 元
決標金額是否含水保工程	<input checked="" type="checkbox"/> 不含水保工程 <input type="checkbox"/> 含水保工程		
水保工程金額	<input type="text"/> 元		
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		

暫存 儲存後送審 離開

填寫發包金額及決標金額

完成日期西元年月日

工程標案名稱

若勾選不含水保工程，需填寫水保工程金額

若執行進度落後，請填寫原因及對策

### 3-2-4 拆建進度填報(學校)-拆除整地\_工程開工日期

#### 拆除整地

- 申請建(拆)照日期
- 領得建(拆)照日期
- 完成工程採購招標文件，上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 舊建築物拆除完成日期
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期

完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2020/05/26
填報項目	5. 工程開工日期		
工程預定進度表	<input type="text"/> (pdf檔)		
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		
<input type="button" value="暫存"/> <input type="button" value="儲存後送審"/> <input type="button" value="離開"/>			

完成日期西元年月日

上傳工程預定進度表

若執行進度落後，請填寫原因及對策

### 3-2-5 拆建進度填報(學校)-拆除整地\_舊建築物拆除完成日期

#### 拆除整地

- 申請建(拆)照日期
- 領得建(拆)照日期
- 完成工程採購招標文件，上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 舊建築物拆除完成日期
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期

完成日期	<input type="text" value=""/>	填報日期	2020/05/26
填報項目	6.舊建築物拆除完成日期		
拆除前照片 (4張) 每張圖檔(.jpg) 最大 2M	序號	照片說明	上傳照片
	1	<input type="text"/>	選擇檔案 未選擇任何檔案
	2	<input type="text"/>	選擇檔案 未選擇任何檔案
	3	<input type="text"/>	選擇檔案 未選擇任何檔案
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		
<input type="button" value="暫存"/> <input type="button" value="儲存後送審"/> <input type="button" value="離開"/>			

完成日期西元年月日

上傳校舍拆除前照片共4張，並簡要說明。

若執行進度落後，請填寫原因及對策

### 3-2-6 拆除進度填報(學校)-拆除整地\_工程竣工日期

#### 拆除整地

- 申請建(拆)照日期
- 領得建(拆)照日期
- 完成工程採購招標文件，上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 舊建築物拆除完成日期
- 工程竣工日期
- 驗收完成日期

完成日期	<input type="text" value="2020/05/26"/>	填報日期	2020/05/26																
填報項目	9. 工程竣工日期																		
竣工圖說	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案	<input type="button" value="上傳竣工圖說及結算表"/>	(pdf檔)																
結算表	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇任何檔案		(pdf檔)																
結算金額	<input type="text"/>	元																	
拆除後照片 (4張) 每張圖檔(jpg) 最大 2M	<table border="1"><tr><td>1</td><td><input type="text"/></td><td><input type="button" value="選擇檔案"/></td><td>未選擇任何檔案</td></tr><tr><td>2</td><td><input type="text"/></td><td><input type="button" value="選擇檔案"/></td><td>未選擇任何檔案</td></tr><tr><td>3</td><td><input type="text"/></td><td><input type="button" value="選擇檔案"/></td><td>未選擇任何檔案</td></tr><tr><td>4</td><td><input type="text"/></td><td><input type="button" value="選擇檔案"/></td><td>未選擇任何檔案</td></tr></table>			1	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/>	未選擇任何檔案	2	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/>	未選擇任何檔案	3	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/>	未選擇任何檔案	4	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/>	未選擇任何檔案
1	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/>	未選擇任何檔案																
2	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/>	未選擇任何檔案																
3	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/>	未選擇任何檔案																
4	<input type="text"/>	<input type="button" value="選擇檔案"/>	未選擇任何檔案																
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>																		
因應對策	<input type="text"/>																		
<input type="button" value="暫存"/> <input type="button" value="儲存後送審"/> <input type="button" value="離開"/>																			

完成日期西元年月日

上傳竣工圖說及結算表

填入結算金額

上傳校舍拆除後照片共4張，並簡要說明。

若執行進度落後，請填寫原因或問題

### 3-2-7 拆建進度填報(學校)-拆除整地\_驗收完成日期

#### 拆除整地

- 申請建(拆)照日期
- 領得建(拆)照日期
- 完成工程採購招標文件，上網公告日期
- 工程決標日期
- 工程開工日期
- 舊建築物拆除完成日期
- 工程竣工日期
- **驗收完成日期**

完成日期	<input type="text"/>	填報日期	2020/05/26
填報項目	10. 驗收完成日期		
執行進度落後原因或問題	<input type="text"/>		
因應對策	<input type="text"/>		

暫存 儲存後送審 離開

完成日期西元年月日

若執行進度落後，請填寫原因或問題



安全-永續-友善
